

Informe Ejecutivo de Ejecución Presupuestaria – PAI LOTAIP

Febrero 2025


Proyecto PROFIP

Resumen Presupuestario a Febrero 2025

Componente	Programado Enero a Febrero (PAI 2025)	Codificado Esigef	Certificado	Comprometido	Devengado	Anticipos	Pagado	Disponible	% Ejecución Devengado+Anticipos vs. Programado PAI 2025
C3.1 Diseñar e implementar el modelo de gestión de la PGE.	19.564,00	2.222.927,48	1.992.473,29	68.665,96	10.564,00	0,00	10.564,00	161.788,23	54,00%
C3.2 Fortalecer la Defensa legal del Estado.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.3 Fortalecer la capacidad de control, consultoría y asesoría legal de la PGE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
C3.4 Fortalecer los centros de mediación de la PGE.	41.859,60	241.463,86	0,00	41.859,60	41.859,59	0,00	5.459,95	199.604,26	100,00%
C3.5 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación de la PGE.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-
TOTAL PROFIP	61.423,60	2.484.391,34	1.992.473,29	110.525,56	52.423,59	0,00	16.023,95	381.392,49	85,35%

% Avance Presupuestario

Codificado: USD 2.484.391,34
Devengado: USD 52.423,59

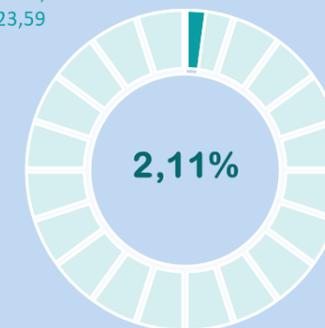

Fortalecimiento Institucional de la PGE

Antecedentes relevantes:

- El Gobierno de la República del Ecuador mantiene con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la operación denominada “Programa de Modernización de la Administración Financiera EC-L1249”, el tercer componente es ejecutado por la PGE a través del Proyecto “Fortalecimiento Institucional de la Procuraduría General del Estado”.
- El proyecto obtuvo dictamen de prioridad el 7 de junio de 2019, mediante oficio No. SENPLADES-SIP-2019-0412-OF, por un monto total de USD 5.525.000 cuya ejecución se realizaría entre el año 2019 y 2023.
- En aplicación del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas en enero de 2020, se realizó la priorización y reprogramación de los procesos que financia el contrato 4812/OC-EC, con esta modificación al préstamo original, el monto pasó a ser de USD 4.933.036 millones; con el que se financia el valor neto e IVA del proyecto de “Fortalecimiento Institucional de la PGE” (PROFIP).
- El 02 de diciembre de 2021, mediante Oficio Nro. SNP-SPN-2021-0974-OF, la Secretaría Nacional de Planificación, emitió el dictamen de actualización de prioridad, por alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025, en el cual se detalla la nueva programación del proyecto por un valor de USD 4.947.810,58, para su ejecución entre los años 2019 al 2023.
- Mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2022-0098-O del 30 de agosto de 2022, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el Dictamen de actualización de prioridad para el Proyecto de inversión, con el cual se amplió el plazo de ejecución hasta el año 2024, así como también se homologaron los indicadores y metas con los instrumentos aprobados por BID.
- En mayo 2023, se validó por parte de BID la recategorización de recursos por lo que el presupuesto total financiado con recursos BID del proyecto pasa a ser de USD 5.160.020,91 para el período 2019-2024, monto que sumado al valor de recursos fiscales que son parte del proyecto llega a un presupuesto total de USD 5.174.795,49.
- Con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0268-O del 02 de agosto de 2024, la Secretaría Nacional de Planificación emitió el dictamen de actualización de prioridad del proyecto para el período 2019 – 2025, por el monto total de USD 5.174.795,49, posterior a ello la PGE gestionó la reprogramación del cronograma valorado obteniendo el criterio favorable con Oficio No. SNP-SNP-SGP-2024-0466-O del 22 de noviembre del 2024.
- En 2025, el MEF asignó un techo presupuestario para el proyecto de USD 2.473.471,45, dicho rubro fue distribuido en las diferentes actividades programadas para 2025, considerando que corresponde al último período fiscal de vigencia del proyecto, se dio prioridad a los procesos que cuentan con certificación presupuestaria plurianual, obligaciones contraídas y actividades más próximas a ejecutarse.
- Al cierre de febrero 2025 se registran montos devengados equivalentes al 2,11% del total codificado en Esigef y respecto al monto programado a devengar en el período enero-febrero, se alcanzó el 85,35%; es importante señalar que el devengamiento de los recursos se vio afectado debido a la falta de liquidez en la caja fiscal, cuya habilitación se dio a finales del mes de febrero.
- Es importante mencionar que al cerrar febrero se registra como codificado en E-sigef el valor de USD 2.484.391,34, mismo que comparado con el techo inicial registra una diferencia de USD 10.919,89, valor que fue asignado a la fuente 998 para amortizar un anticipo entregado en 2024, sin embargo, con este valor se registra un incremento al techo, lo cual está siendo gestionado internamente para regularizar dicho valor en el PAI institucional, así como la gestión para recuperar el monto faltante en la asignación, parte del presupuesto global del proyecto.

Proyecto PROFIP

Estado de los procesos contractuales a febrero 2025:

Componente 1:

1. **“Contratación de una Firma Consultora para la Implementación, puesta en marcha y acompañamiento del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado todo ello en el marco del nuevo Modelo de Gestión y la Agenda Digital de la Procuraduría General del Estado”**, con fecha 01 de septiembre de 2023 se firmó el contrato. Con fecha 08 de septiembre de 2023 se recibió el Producto 0, que fue aprobado y pagado por MEF en diciembre 2023. El Producto Nro. 1 se recibió en mayo de 2024, fue revisado, aprobado y pagado en junio de 2024. A 9 de septiembre se recibió el Producto 2, fue revisado, aprobado y pagado en noviembre de 2024. En diciembre se emitió la Enmienda No. 03, que en lo sustancial modifica las fechas de entrega de los productos 3 al 11, desde mayo hasta noviembre de 2025. / **EN EJECUCIÓN.**
2. **“Capacitación en innovación y gestión del cambio en el sector público dirigido a los directivos y funcionarios del grupo anfitrión de la PGE”**, se cuenta con No objeción para la contratación directa, se prevé solicitar el inicio del proceso para la segunda semana de marzo de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**
3. **“Renovación parcial de equipos informáticos de usuario final a nivel nacional para fortalecer el hardware de la Procuraduría General del Estado”**, la unidad requirente está actualizando los documentos para la contratación, se prevé contar con certificación de recursos para iniciar el proceso en abril de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**
4. **“Especialista de Monitoreo y Seguimiento del EDG-PGE PROFIP”**, se firmó Contrato No. 005-PGE-PROFIP-2024, en diciembre 27 de 2024, se ha cancelado los productos 1 y 2. / **EN EJECUCIÓN.**
5. **“Especialista de Adquisiciones del EDG-PGE-PROFIP”**, se firmó Contrato No. 006-PGE-PROFIP-2024, en diciembre 27 de 2024, se han cancelado los productos 1 y 2. / **EN EJECUCIÓN.**
6. **“Especialista de Tecnologías de la Información y Comunicación del EDG-PGE PROFIP”**, se ha aprobado en el plan de adquisiciones, se prevé iniciar el proceso la tercera semana de marzo de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**
7. **“Especialista Financiero del EDG-PGE PROFIP”**, se ha aprobado en el plan de adquisiciones, se prevé iniciar el proceso en la cuarta semana de marzo de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**
8. **“Especialista de Capacitación”**, proceso en fase preparatoria de términos de referencia por parte de la unidad requirente. Se espera contar con borrador de TDRs para revisión en marzo de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**
9. **“Especialistas en Arquitectura (1) y desarrollo de software(1)”**, procesos en fase de revisión de TDRs por parte del Despacho. / **EN ETAPA PREVIA.**

Componente 2 y Componente 3:

Estos componentes a la fecha han concluido su gestión con 100% de ejecución.

Componente 4:

1. **“Readecuación del Centro de Mediación de Guayaquil”**, se recibió la No Objeción por parte de BID para iniciar un primer proceso. / **DECLARADO DESIERTO.** Se realizó un segundo proceso, con fecha 24 de septiembre se firmó el Contrato No.004-PGE-PROFIP-2024, a la fecha se ha culminado la readecuación; por el cierre temprano de la herramienta E-sigef para 2024 no se pudo culminar con el pago del contrato, se ha enviado el pago a MEF. / **EN PROCESO DE PAGO.**
2. **“Readecuación del Centro de Mediación de Quito”**, tiene No objeción de BID a los términos de referencia, se prevé iniciar la adjudicación y gestiones de readecuación en el mes de abril de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**
3. **“Readecuación de los Centros de Mediación de Cuenca, Portoviejo y Riobamba”** los documentos de estos procesos se encuentran al momento para la revisión del Despacho, se prevé iniciar la adjudicación y gestiones de readecuación en el mes de abril de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**

Componente 5:

1. **“Capacitación en herramientas de capacitación”** Se prevé la realización de esta capacitación en mayo de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**
2. **“Encuesta de evaluación de percepción de la PGE”** Se prevé la realización de esta consultoría en agosto de 2025. / **EN ETAPA PREVIA.**
